

Comunicação		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		CNPJ: 76.958.966/0001-06	
Endereço: RUA GARÇAS, 750 - CENTRO			
Cidade: ARAPONGAS – PR	CEP: 86.700-285	DDD/Telefone: (43) 3902-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SERGIO ONOFRE DA SILVA		C.P.F. 477.980.099-49	
C.I./Órgão Expedidor: 3.438.984-5 / SSP PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ALBATROZ REAL, 33 – CONJ. FLAMINGOS		CEP: 86703-341	
Município: ARAPONGAS - PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99981-6855	
E-mail 1: seodur@arapongas.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@arapongas.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3902-1020	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ROUXINOL	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias ✓
2.2 Trecho		
RUA ROUXINOL, TRECHO ENTRE PARQUE INDUSTRIAL XI E ESTRADA DA COLÔNIA ESPERANÇA.		
23°28'08"S / 51°25'36"O		
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 12.736,73 m² EXTENSÃO DO TRECHO: 1,37 Km		

Fomento		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A Rua Rouxinol, no trecho entre o Parque Industrial XI e a Estrada da Colônia Esperança é uma importante via de ligação entre a área urbana e a área rural de avicultura de postagem onde estão localizadas várias granjas responsáveis pela produção em grande escala, o que gera divisas importantes para a economia local, além da produção de abacate, soja, milho, trigo, entre outros.

A pavimentação visa atender o escoamento de produção local, melhorar o acesso a indústria (moinho de trigo) e a escola municipal, além de melhorar o acesso entre o polo produtivo e o núcleo urbano, e fomentar o turismo, tendo em vista que a Colônia Esperança é um importante ponto turístico histórico da cidade de Arapongas.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO *						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	1	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	60
2	1	TERRAPLENAGEM	M3	20.871,03	60	150
3	1	DRENAGEM	M	1.292,00	60	180
4	1.1	PAVIMENTAÇÃO	M2	12.736,73	120	210
	1.2	LIGANTES BETUMINOSOS	T	108,77	120	210
4	5	SINALIZAÇÃO	M2	4.418,27	210	240
5	6	URBANIZAÇÃO	M2	9.382,81	150	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	0,00	R\$ 184.898,56
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	R\$2.000.000,00	0,00

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$244.070,33	R\$16.917,98	0,00
120	R\$190.211,85	R\$13.184,72	0,00
150	R\$491.316,24	R\$34.056,07	0,00
180	R\$474.788,87	R\$32.910,46	0,00
210	R\$426.699,78	R\$29.577,12	0,00
240	R\$172.912,93	R\$11.985,63	0,00
Sub-total	R\$2.000.000,00	R\$138.631,98	0,00
Total geral	R\$2.138.631,98		

Fomento Municipal		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO


6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Arapongas/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 138.631,98 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) na forma de Pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local : Arapongas

Data : 21 de Março de 2018

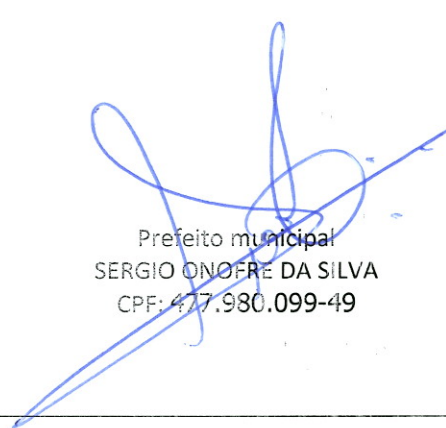

Prefeito municipal
SERGIO ONOFRE DA SILVA
CPF: 477.980.099-49

FUNDIÁRIO		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Piano de Trabalho	Página 5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em, _____

José Riche Filho

Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia (conforme for o caso).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município : ARAPONGAS - PR

Elaborado em : 20/03/2017

Trecho : Pavimentação e Drenagem da Rua Rouxinol

Subtrecho: Entre Parque Industrial XI e Estrada da Colônia Esperança

Extensão: 1,37 km



CRONOGRAMA FÍSICO (%)								
GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR							
	30	60	90	120	150	180	210	240
Licitação/Contratação	50	50						
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			50					50
TERRAPLENAGEM			40	30	30			
DRENAGEM			25	25	25	25		
PAVIMENTAÇÃO					34	33	33	
LIGANTES BETUMINOSOS					34	33	33	
SINALIZAÇÃO							50,00	50,00
URBANIZAÇÃO						20,00	40,00	40,00

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)									
PARTICIPAÇÃO		A REALIZAR							
		30	60	90	120	150	180	210	240
Município	Parcial	0,00	0,00	16.917,98	13.184,72	34.055,07	32.910,46	29.577,12	11.985,63
	Acumulado	0,00	0,00	16.917,98	30.102,70	64.153,77	97.069,23	126.646,35	138.631,98
Estado	Parcial	0,00	0,00	244.070,33	190.211,85	491.316,24	474.788,87	426.699,78	172.912,93
	Acumulado	0,00	0,00	244.070,33	434.282,17	925.593,42	1.400.387,28	1.827.087,07	2.000.000,00
Total	Parcial	0,00	0,00	260.988,30	203.396,57	525.372,32	507.699,33	456.276,90	184.898,56
	Acumulado	0,00	0,00	260.988,30	464.384,87	989.757,19	1.497.456,52	1.953.733,42	2.138.631,98

Eng. ÉRICK CHAGAS FERREIRA

Crea-PR 158.591/D
